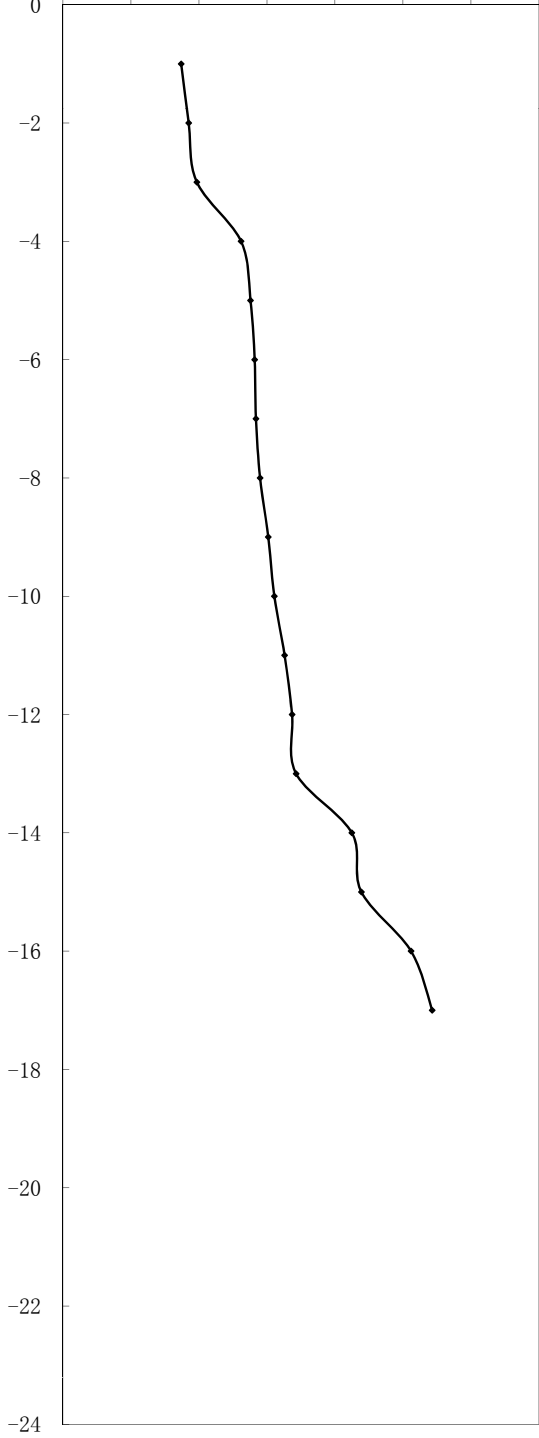
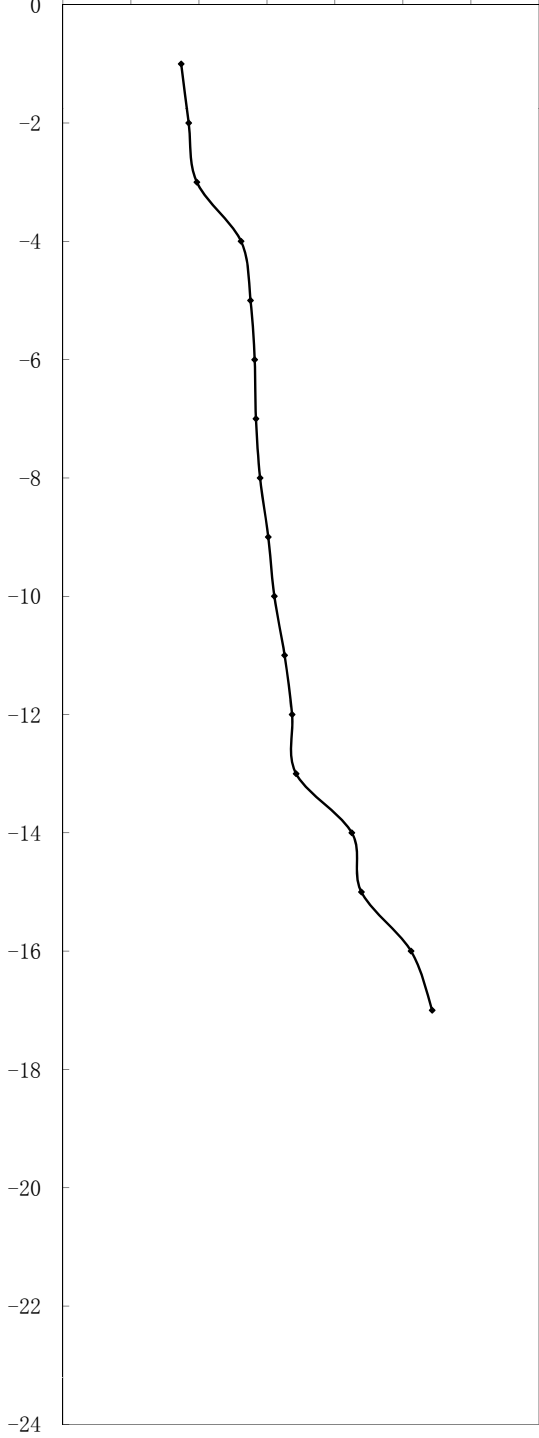


嵊州市艇湖区块中学Z8#孔剪切波速成果表

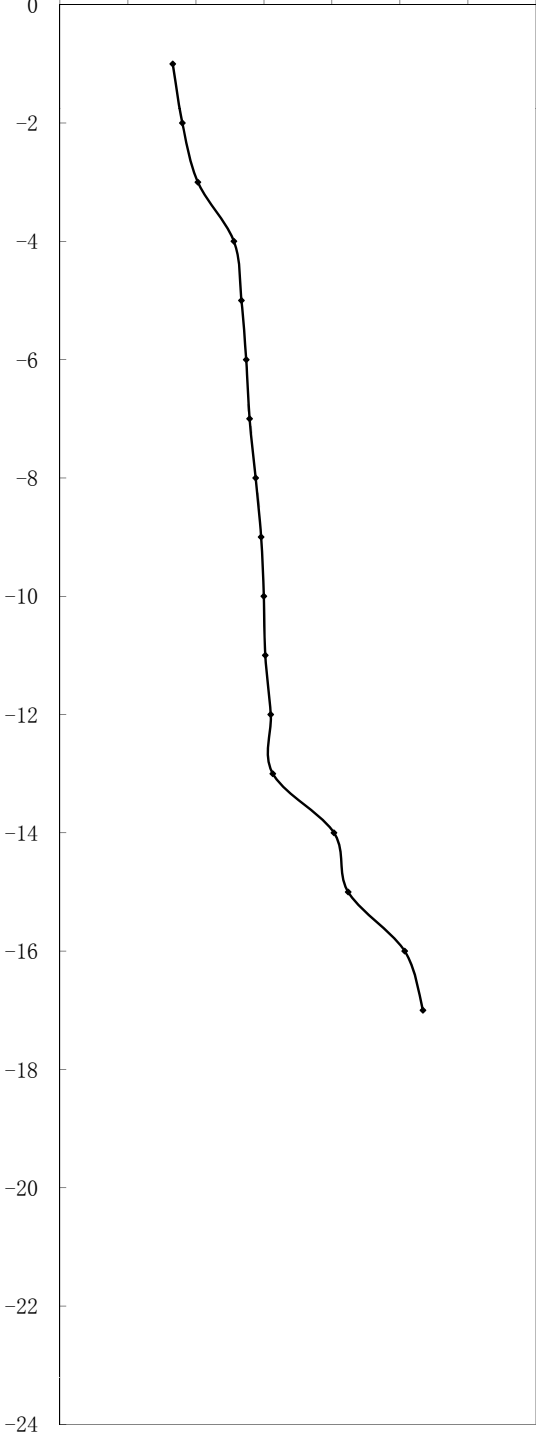
层位	深度 (m)	土层名称	深度----速度曲线 (m/s) 	测点深	剪切波速	平均剪切波速
				m	Vs (m/s)	Vs (m/s)
2	3.7	粉质黏土	深度----速度曲线 (m/s) 	-1	174	185.3
				-2	185	
				-3	197	
				-4	262	301.3
				-5	276	
				-6	282	
				-7	284	
				-8	290	
				-9	302	
				-10	311	
				-11	326	
				-12	337	
				-13	343	
4-1	15.5	强风化砂砾岩		-14	425	432.0
				-15	439	
4-2	17.0	中风化砂砾岩		-16	512	527.5
				-17	543	

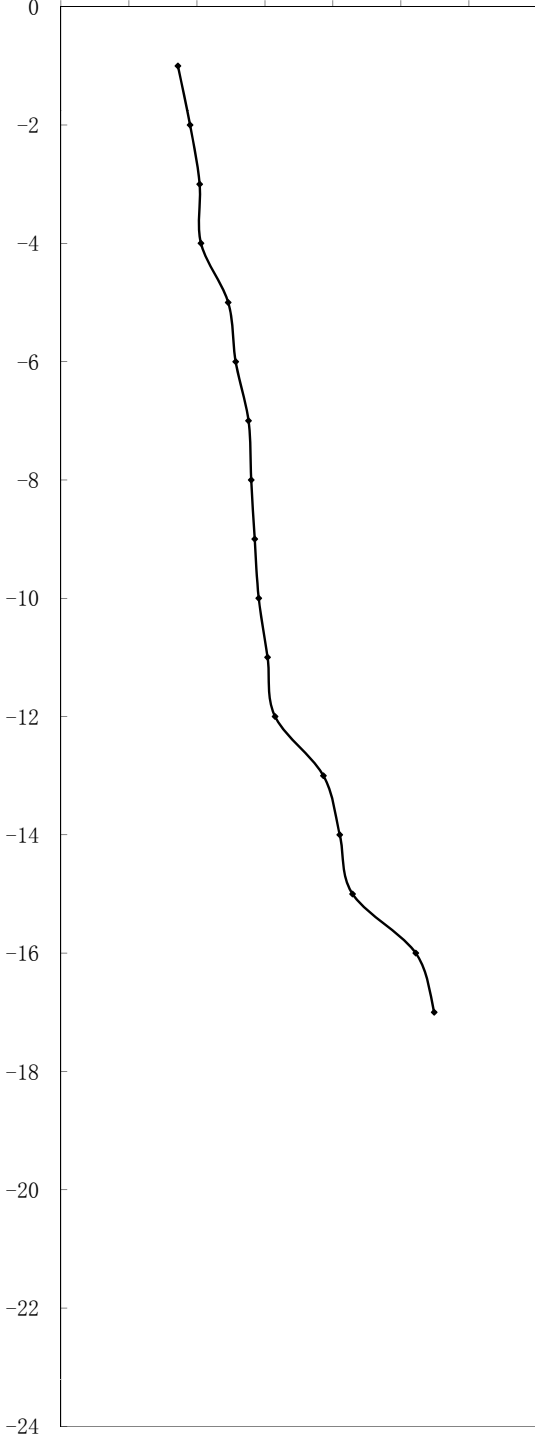
Z8#孔地面以下覆盖层等效剪切波速为273.7m/s

浙江中林勘察研究股份有限公司

审核:

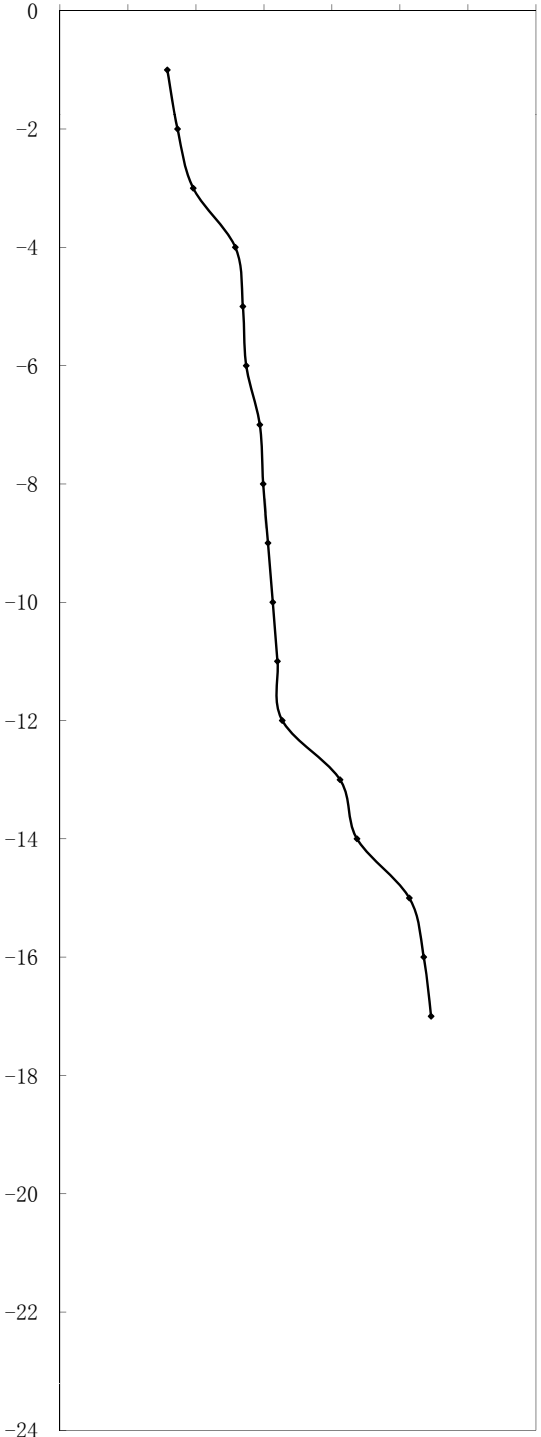
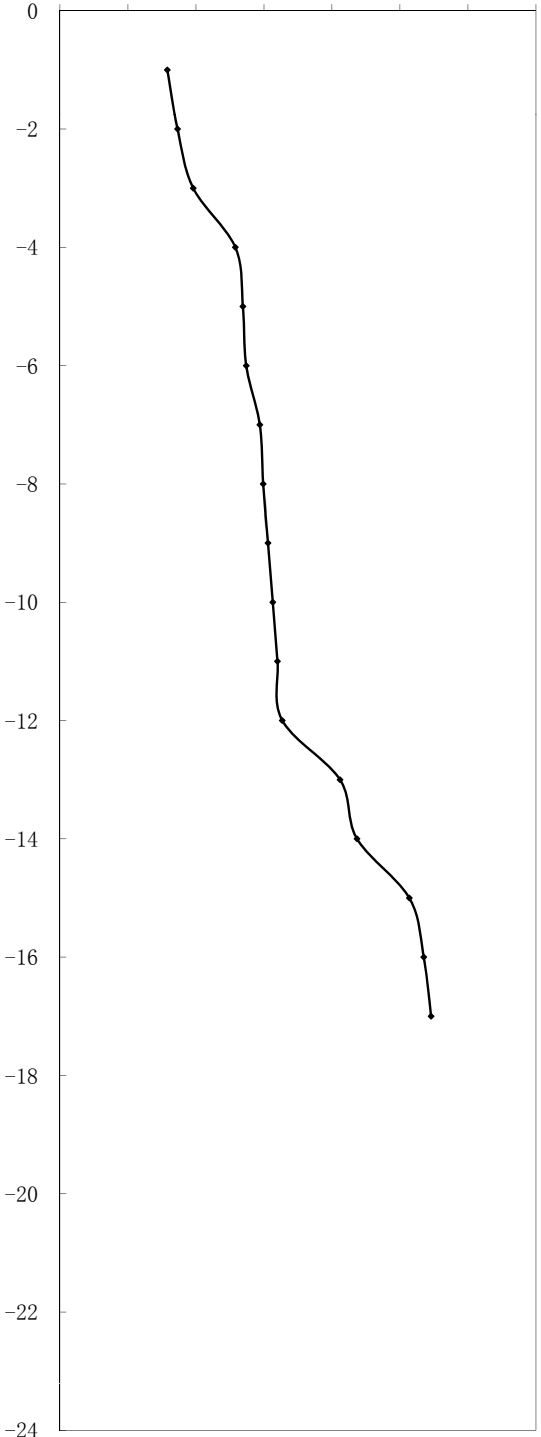
检测:

嵊州市艇湖区块中学Z21#孔剪切波速成果表						
层位	深度 (m)	土层名称	深度----速度曲线 (m/s) 	测点深	剪切波速	平均剪切波速
				m	Vs (m/s)	Vs (m/s)
2	3.5	粉质黏土		-1	166	183.0
				-2	180	
				-3	203	
3	13.0	圆砾		-4	256	288.5
				-5	267	
				-6	274	
				-7	279	
				-8	288	
				-9	296	
				-10	300	
				-11	302	
				-12	310	
				-13	313	
4-1	15.7	强风化砂砾岩		-14	403	413.5
				-15	424	
4-2	17.0	中风化砂砾岩		-16	507	520.5
				-17	534	
Z21#孔地面以下覆盖层等效剪切波速为268.0m/s						
浙江中林勘察研究股份有限公司			审核:	检测:		

嵊州市艇湖区块中学Z26#孔剪切波速成果表						
层位	深度 (m)	土层名称	深度----速度曲线 (m/s) 	测点深	剪切波速	平均剪切波速
				m	Vs (m/s)	Vs (m/s)
2	4.1	粉质黏土	-1	172	193.0	
			-2	190		
			-3	204		
			-4	206		
3	12.7	圆砾	-5	246	281.8	
			-6	257		
			-7	276		
			-8	280		
			-9	285		
			-10	291		
			-11	304		
			-12	315		
4-1	15.7	强风化砂砾岩	-13	386	408.3	
			-14	410		
			-15	429		
4-2	17.0	中风化砂砾岩	-16	522	535.5	
			-17	549		
Z26#孔地面以下覆盖层等效剪切波速为265.6m/s						
浙江中林勘察研究股份有限公司			审核:	检测:		

嵊州市艇湖区块中学Z55#孔剪切波速成果表						
层位	深度 (m)	土层名称	深度----速度曲线 			

嵊州市艇湖区块中学Z64#孔剪切波速成果表

层位	深度 (m)	土层名称	深度----速度曲线 (m/s) 	测点深	剪切波速	平均剪切波速
				m	Vs (m/s)	Vs (m/s)
2	3.0	粉质黏土	深度----速度曲线 (m/s) 	-1	158	175.7
				-2	173	
				-3	196	
				-4	258	295.6
				-5	269	
				-6	274	
				-7	294	
				-8	299	
				-9	306	
				-10	313	
				-11	320	
				-12	327	
4-1	14.8	强风化砂砾岩		-13	412	424.5
				-14	437	
4-2	17.0	中风化砂砾岩		-15	514	531.7
				-16	535	
				-17	546	

Z64#孔地面以下覆盖层等效剪切波速为273.5m/s

浙江中林勘察研究股份有限公司

审核:

检测:

嵊州市艇湖区块中学Z70#孔剪切波速成果表						
层位	深度 (m)	土层名称	深度----速度曲线 (m/s)	测点深	剪切波速	平均剪切波速
				m	Vs (m/s)	Vs (m/s)
2	3.2	粉质黏土		-1	170	184.7
				-2	185	
				-3	199	
3	11.8	圆砾		-4	267	287.1
				-5	269	
				-6	275	
				-7	281	
				-8	288	
				-9	296	
				-10	307	
				-11	314	
4-1	14.5	强风化砂砾岩		-12	395	408.0
				-13	407	
				-14	422	
4-2	17.0	中风化砂砾岩		-15	495	521.0
				-16	526	
				-17	542	
Z70#孔地面以下覆盖层等效剪切波速为269.0m/s						
浙江中林勘察研究股份有限公司			审核:	检测:		

嵊州市艇湖区块中学Z90#孔剪切波速成果表

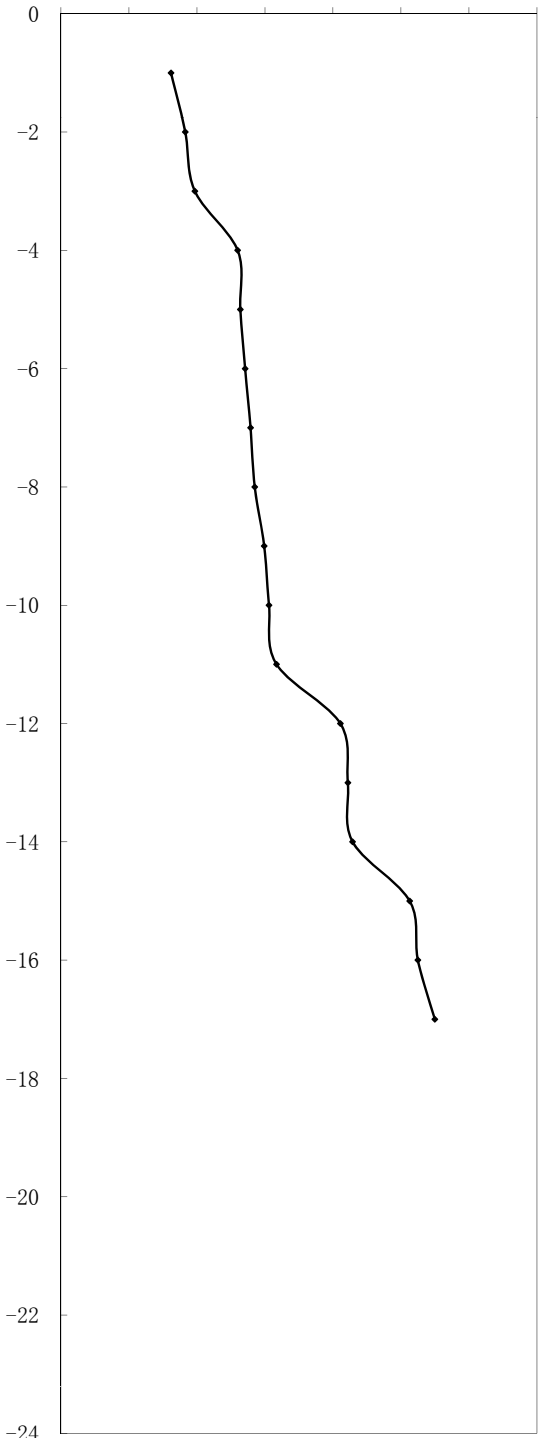
[illegible]

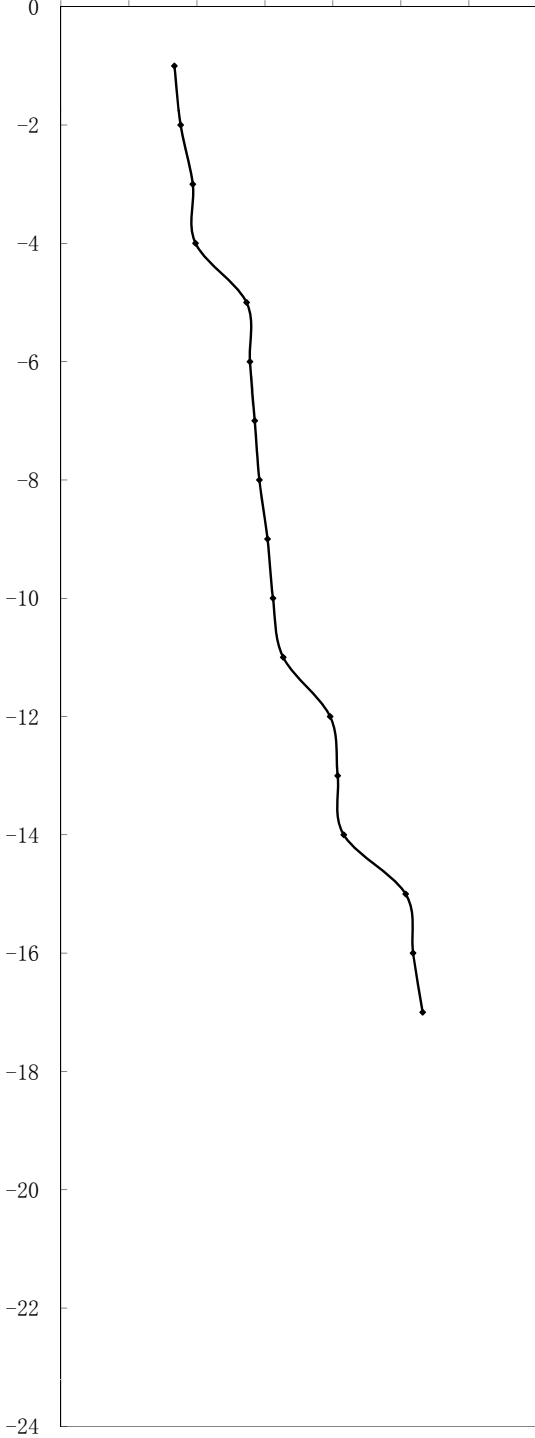
Z90#孔地面以下覆盖层等效剪切波速为259.1m/s

浙江中林勘察研究股份有限公司	审核:	检测:
----------------	-----	-----

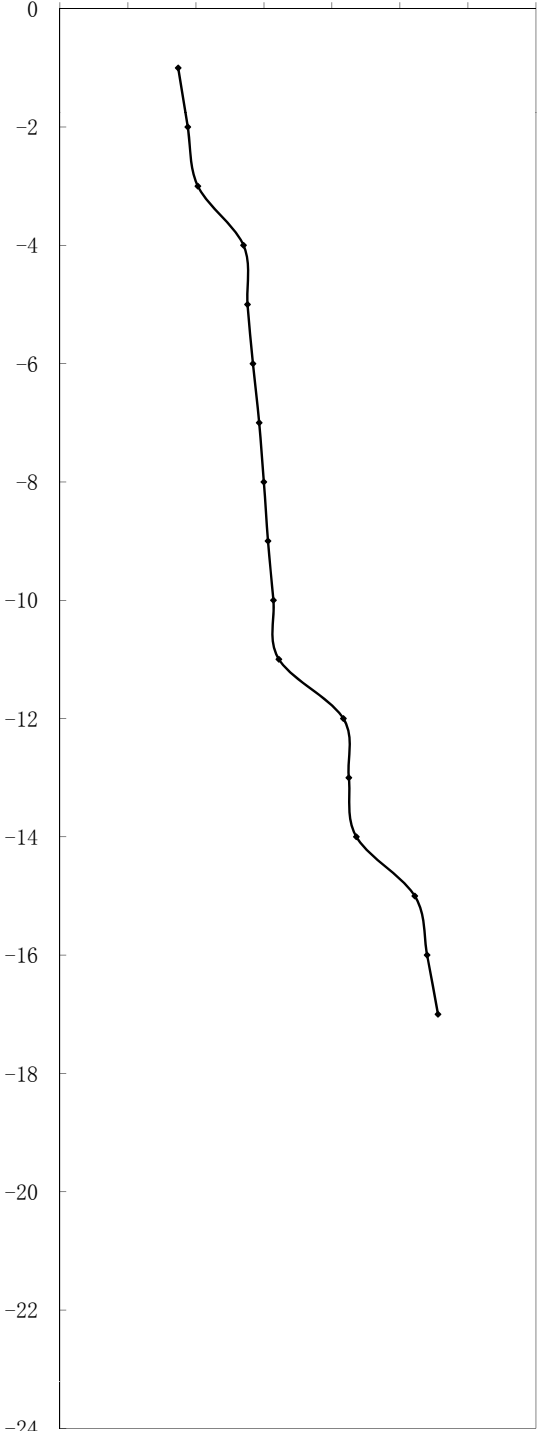
审核:

检测:

嵊州市艇湖区块中学Z111#孔剪切波速成果表						
层位	深度 (m)	土层名称	深度----速度曲线 	测点深	剪切波速	平均剪切波速
				m	Vs (m/s)	Vs (m/s)
2	3.4	粉质黏土		-1	162	180.7
				-2	183	
				-3	197	
3	11.2	圆砾		-4	260	285.1
				-5	264	
				-6	271	
				-7	279	
				-8	285	
				-9	299	
				-10	306	
				-11	317	
				-12	411	
4-1	14.5	强风化砂砾岩	-13	422		
			-14	429		
4-2	17.0	中风化砂砾岩		-15	513	529.3
				-16	525	
				-17	550	
Z111#孔地面以下覆盖层等效剪切波速为268.4m/s						
浙江中林勘察研究股份有限公司			审核:	检测:		

嵊州市艇湖区块中学Z123#孔剪切波速成果表						
层位	深度 (m)	土层名称	深度----速度曲线 	测点深	剪切波速	平均剪切波速
				m	Vs (m/s)	Vs (m/s)
2	4.1	粉质黏土	-1	167	183.8	
			-2	176		
			-3	194		
			-4	198		
3	11.5	圆砾	-5	273	295.9	
			-6	278		
			-7	285		
			-8	292		
			-9	304		
			-10	312		
			-11	327		
4-1	14.9	强风化砂砾岩	-12	396	406.3	
			-13	407		
			-14	416		
4-2	17.0	中风化砂砾岩	-15	507	519.0	
			-16	518		
			-17	532		
Z123#孔地面以下覆盖层等效剪切波速为267.6m/s						
浙江中林勘察研究股份有限公司			审核:	检测:		

嵊州市艇湖区块中学Z153#孔剪切波速成果表						
层位	深度 (m)	土层名称	深度----速度曲线 0100200300400500600700 (m/s) 0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24	测点深	剪切波速	平均剪切波速
				m	Vs (m/s)	Vs (m/s)
2	3.9	粉质黏土	-1	160	179.0	
			-2	182		
			-3	195		
3	11.7	圆砾	-4	266	289.9	
			-5	269		
			-6	275		
			-7	283		
			-8	294		
			-9	301		
			-10	311		
			-11	320		
4-1	15.4	强风化砂砾岩	-12	394	411.8	
			-13	406		
			-14	417		
			-15	430		
4-2	17.0	中风化砂砾岩	-16	505	514.0	
			-17	523		
Z153#孔地面以下覆盖层等效剪切波速为267.0m/s						
浙江中林勘察研究股份有限公司			审核:	检测:		

嵊州市艇湖区块中学Z162#孔剪切波速成果表						
层位	深度 (m)	土层名称	深度----速度曲线 	测点深	剪切波速	平均剪切波速
				m	Vs (m/s)	Vs (m/s)
2	3.8	粉质黏土	-1	174	188.3	
			-2	188		
			-3	203		
3	11.2	圆砾	-4	270	295.6	
			-5	276		
			-6	284		
			-7	293		
			-8	300		
			-9	306		
			-10	314		
			-11	322		
			-12	417		426.0
4-1	14.5	强风化砂砾岩	-13	425		
			-14	436		
4-2	17.0	中风化砂砾岩	-15	522	539.3	
			-16	540		
			-17	556		
Z162#孔地面以下覆盖层等效剪切波速为273.8m/s						
浙江中林勘察研究股份有限公司			审核:	检测:		

嵊州市艇湖区块中学Z169#孔剪切波速成果表

[illegible]

Z169#孔地面以下覆盖层等效剪切波速为275.3m/s

浙江中林勘察研究股份有限公司	审核:	检测:
----------------	-----	-----

审核:

检测:
